

12. 06. 2026

PROJEKT 10454/0D/26
MAGISTRÁT MĚSTSKÝ
KARLOVY VARY

FLEX dopravně inženýrské služby s.r.o., Rosnická 118., 360 10 Karlovy Vary
Tel./fax: 353569231, 353569632 OR Plzeň, oddíl C, vložka 7402
E-mail: info@flexkv.cz, objednavky@flexkv.cz

Návrh dopravního opatření

Stavba: KV, Sadov, Podlesí-prodloužení stávajícího vodovodu
-montážní jámy 2x2m (2x)

Realizace: Vodárny a kanalizace a.s.
Karlovy Vary

Dopravní značení se navrhuje dle příloh s tím, že:

1. montážní jámy budou prováděny s tím, že po celé délce budou zabezpečeny pomocí zábran Z2 a SDZ B30 s minimálním průjezdem 2,75 metru a SDZ A15 v kombinaci s A6b a B20 (30)-Manipulační technika zhotovitele bude po celé délce zabezpečena pomocí směrových desek Z4
2. v případě potřeby zajistí dodavatel prací krátkodobé ruční řízení provozu pomocí náležitě poučených a vybavených pracovníků-průjezd IZS!!!
3. přes překopané vjezdy budou použity pojezdové plechy na vstupy do objektů přechodové lávky
4. dopravní značky reflexní, základní velikost
5. vzdálenosti dle TP 66 – II. vydání

Vyjádření Policie ČR-DI Karlovy Vary:

Zbyněk Morávek
Karlovy Vary 26.2.2026


Bc. Petr Chvostal
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Čas podepsání: 20.05.2026 9:30:38

12. 06. 2026

PRŮBĚH: 10454/0D126

PROJEKT: 10454/0D126

Celková situace

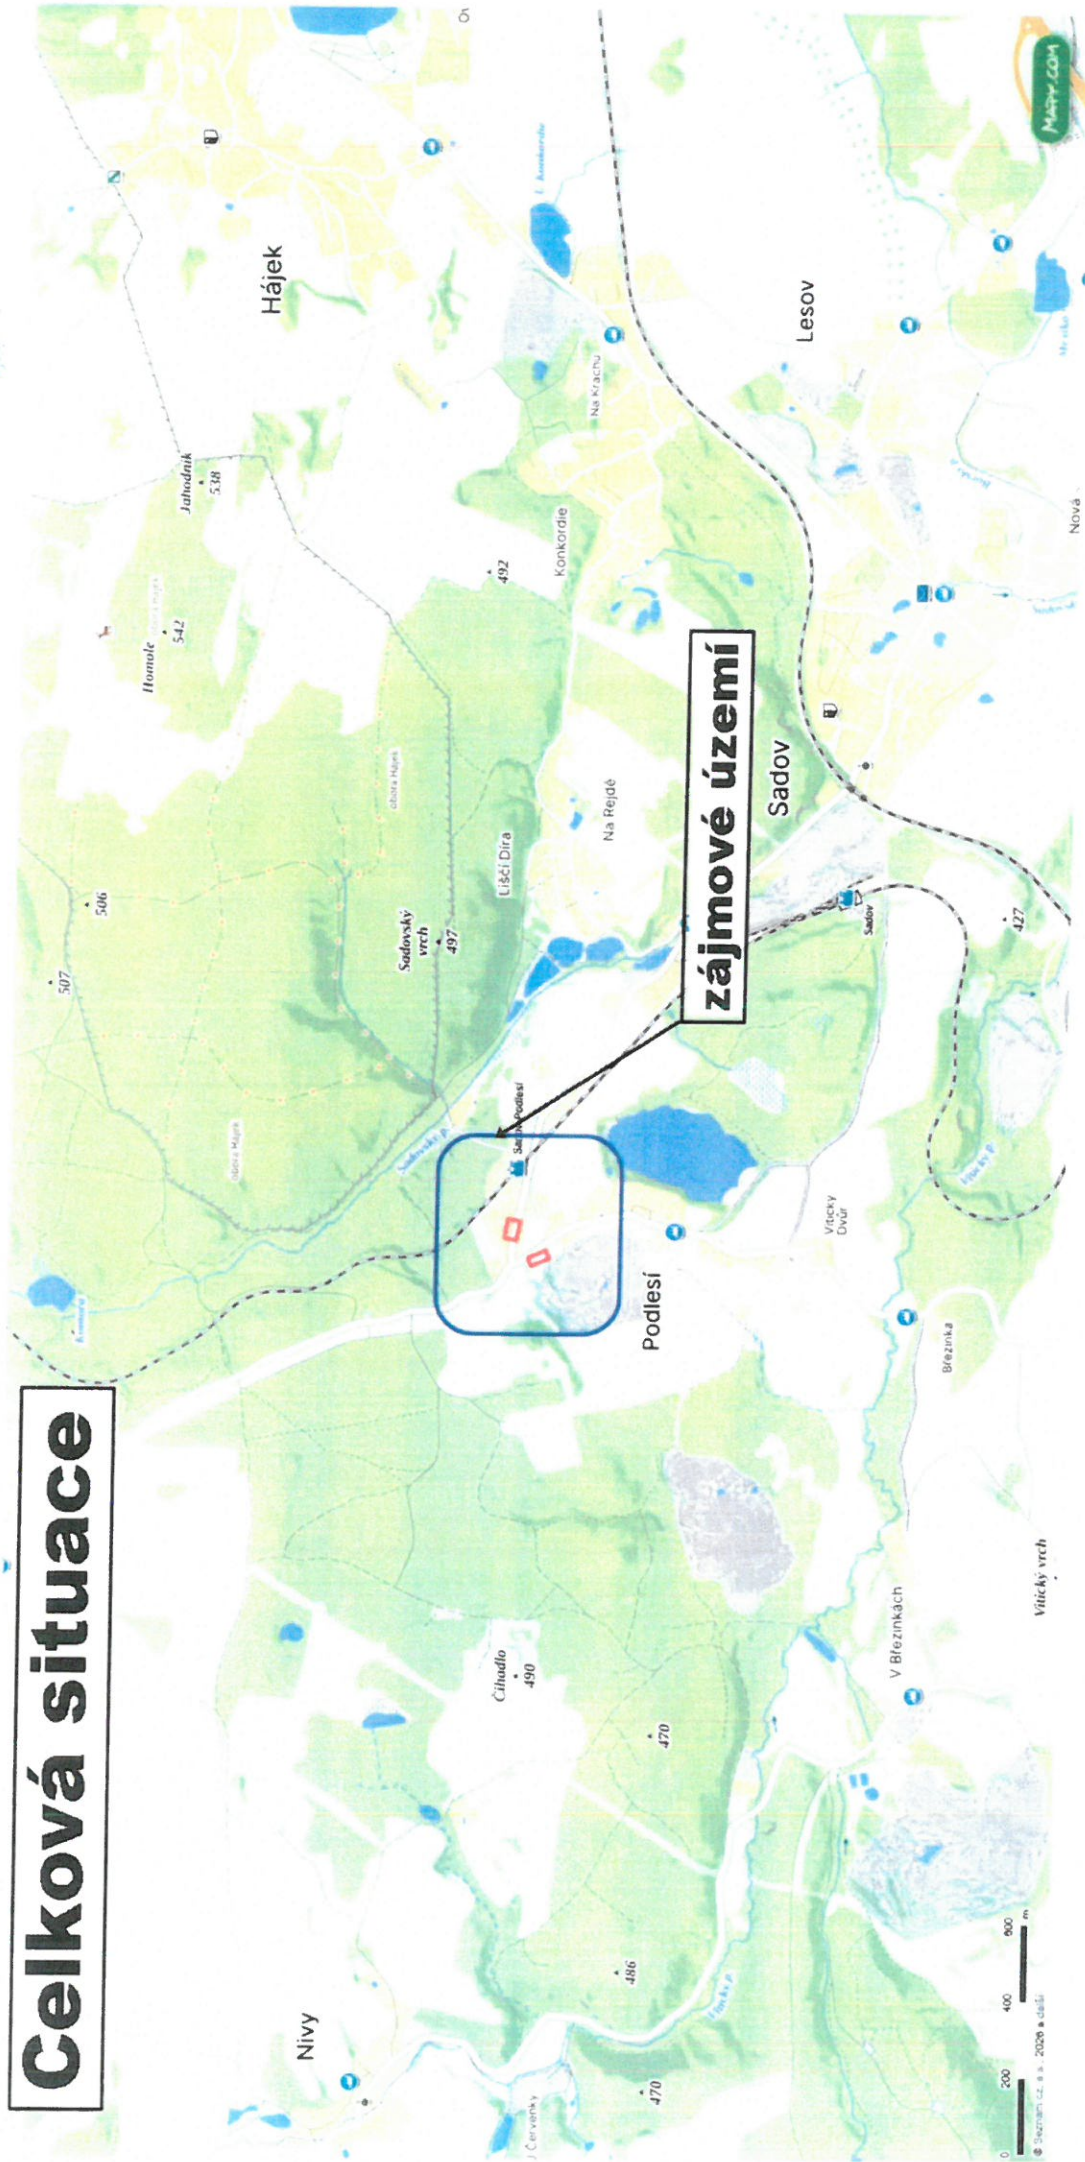


12. 06. 2026

PRŮBĚH J. 10458/00126

229

KV, Sadov-Podlesí-prodloužení vodovodu

výkop 2x2 metry a
montážní technika zhotovitele

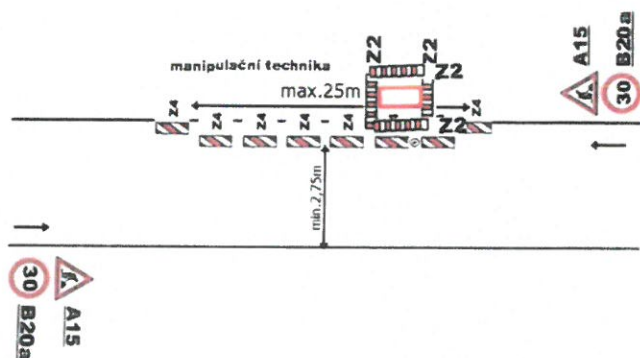

0 25 50 75 m

© Seznam.cz, s.r.o. 2026 • data

Mapy.cz
